

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县肉联厂边坡除险加固工程

县级项目主管部门：大埔县湖寮镇人民政府

填报人姓名：郭奕智

联系电话：0753-5556233

填报日期：2022 年 5 月

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为消除新建肉类联合加工厂左侧边坡地质安全隐患，切实维护周边群众生命财产安全，保障企业安全有序运转，实施大埔县肉联厂边坡除险加固工程。

（二）项目决策情况。

经日常地质灾害巡查发现，肉类联合加工厂左侧边坡存在安全隐患，在对该处山体边坡进行勘察后，镇党政会议研究决定对此山体进行除险加固。

（三）绩效目标。

为消除新建肉类联合加工厂左侧边坡地质安全隐患，切实维护周边群众生命财产安全，保障企业安全有序运转。


二、绩效自评工作组织情况

在镇政府党政综合办公室的牵头下，镇经济发展办、规划建设办公室、经济发展和财政服务中心、公用事业服务中心共同参与，就大埔县肉联厂边坡除险加固工程的立项、审批、工程进展、资金支付、安全评估等方面开展自评工作。

三、绩效自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合本单位的自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2021 年，湖寮镇人民政府根据年初工作计划，统筹安排，较好地完成了年度工作目标。从评价情况来看，基本完成项目绩效目标。

综合评价等级为：“优”，得：93.58 分。

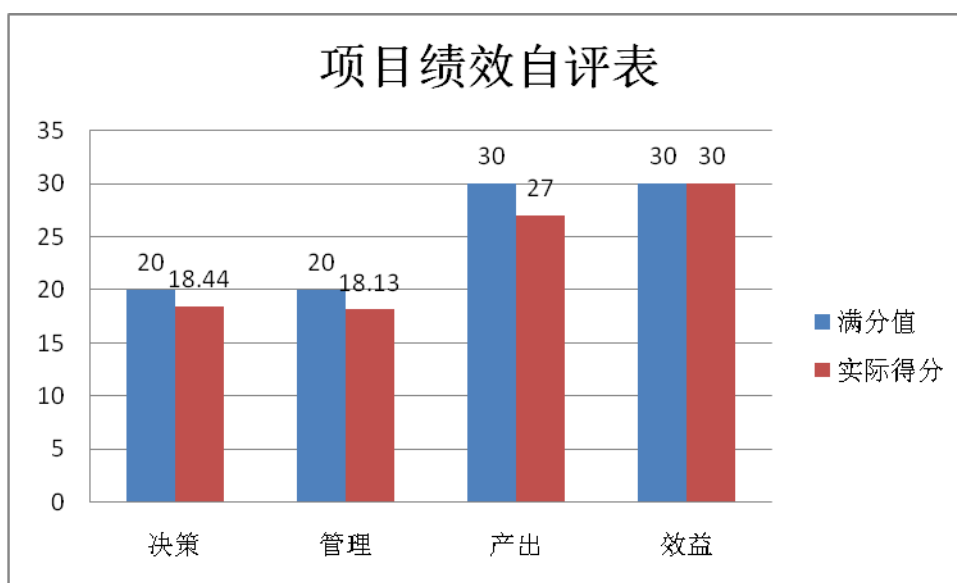

四、绩效指标分析

（一）决策分析：该项指标自评得 18.44 分。

1. 项目立项情况。该项指标自评得 12 分。

（1）论证决策。

该项指标自评得 4 分。本项目论证充分,依据埔府函【2020】138 号、埔发改【2020】109 号文实施。

(2) 目标设置。

该项指标自评得 6 分,绩效目标覆盖全面、内容完整,与项目属性特点、支出内容关联度强,各项目标设置已量化,具有可衡量性。

(3) 保障措施。

该项指标自评得 2 分。本单位以《湖寮镇机关财务管理制度》、《建设项目管理制度》等作为项目实施的制度保障,制度完整,计划安排合理。

2. 资金落实情况。该项指标得 6.44 分。

(1) 资金到位。

该项指标自评得 3.44 分。2020-2021 年应到位金额 191.52 万元,实际到位金额 131.9 万元,资金到位率为 68.87% (实际到位金额/应到位金额)。

(2) 资金分配。

该项指标自评得 3 分。本单位资金分配合理,有助于实现

资金的绩效目标。

(二) 管理分析：该项指标自评得 18.13 分。

1. 资金管理。该项指标自评得 10.13 分。

(1) 资金支付。

该项指标自评得 4.13 分。该项目资金支出率为 68.87%。
不存在因垫资或履行支付手续而影响支出率等情况。

(2) 支出规范性。

该项指标自评得 6 分。该项目严格按照监理公司确认的工程量支付工程款，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范。

2. 事项管理。该项指标自评得 8 分。

(1) 实施程序。

该项指标自评得 4 分。该项目按规定程序实施，包括项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

该项指标自评得 4 分。该项目由具备资质的监理公司全程

予以监督，管理情况良好。

（三）产出分析：该项指标自评得 27 分。

1. 经济性。

该项指标自评得 9 分。该项目在在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出并未超出预算计划，且与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

2. 效率性。

该项指标自评得 18 分。该项目按照合同约定的履约进度有序推进，并在计划时间内如期竣工，经验收工程质量达标。工程工期情况 2020 年 8 月 13 日至 2021 年 1 月 12 日，于 2021 年 2 月 4 日经业主、监理、施工方共同正式验收合格并予以交付。

（四）效益实现度分析：该项指标自评得 30 分。

1. 效果性。

该项指标自评得 25 分。该项目共占地 3663.14 平方米，工程包括修建道路，完善排水，修筑片石挡土墙及边坡锚喷支护等，为肉类联合加工厂提供了安全生产环境，项目能够持续发挥作用，对肉联厂行业未来产生可持续影响。降低了安全生产事故

率，排除了地质安全隐患保障了周边群众的生命财产安全。

2. 公平性

该项指标自评得 5 分。无论是项目受益企业肉联厂还是周边的受益群众，都对此项工程的实施表示满意。

五、存在问题。

年初部门预算和专项资金下达较迟，不利于专项资金拨付（进度款）及工程竣工验收结算。

六、下一步工作计划。

下一步，我单位将加强对肉联厂边坡的日常巡查，及时排除安全隐患，确保本项目工程的效益发挥，为肉联厂的安全生产提供持续保障。
